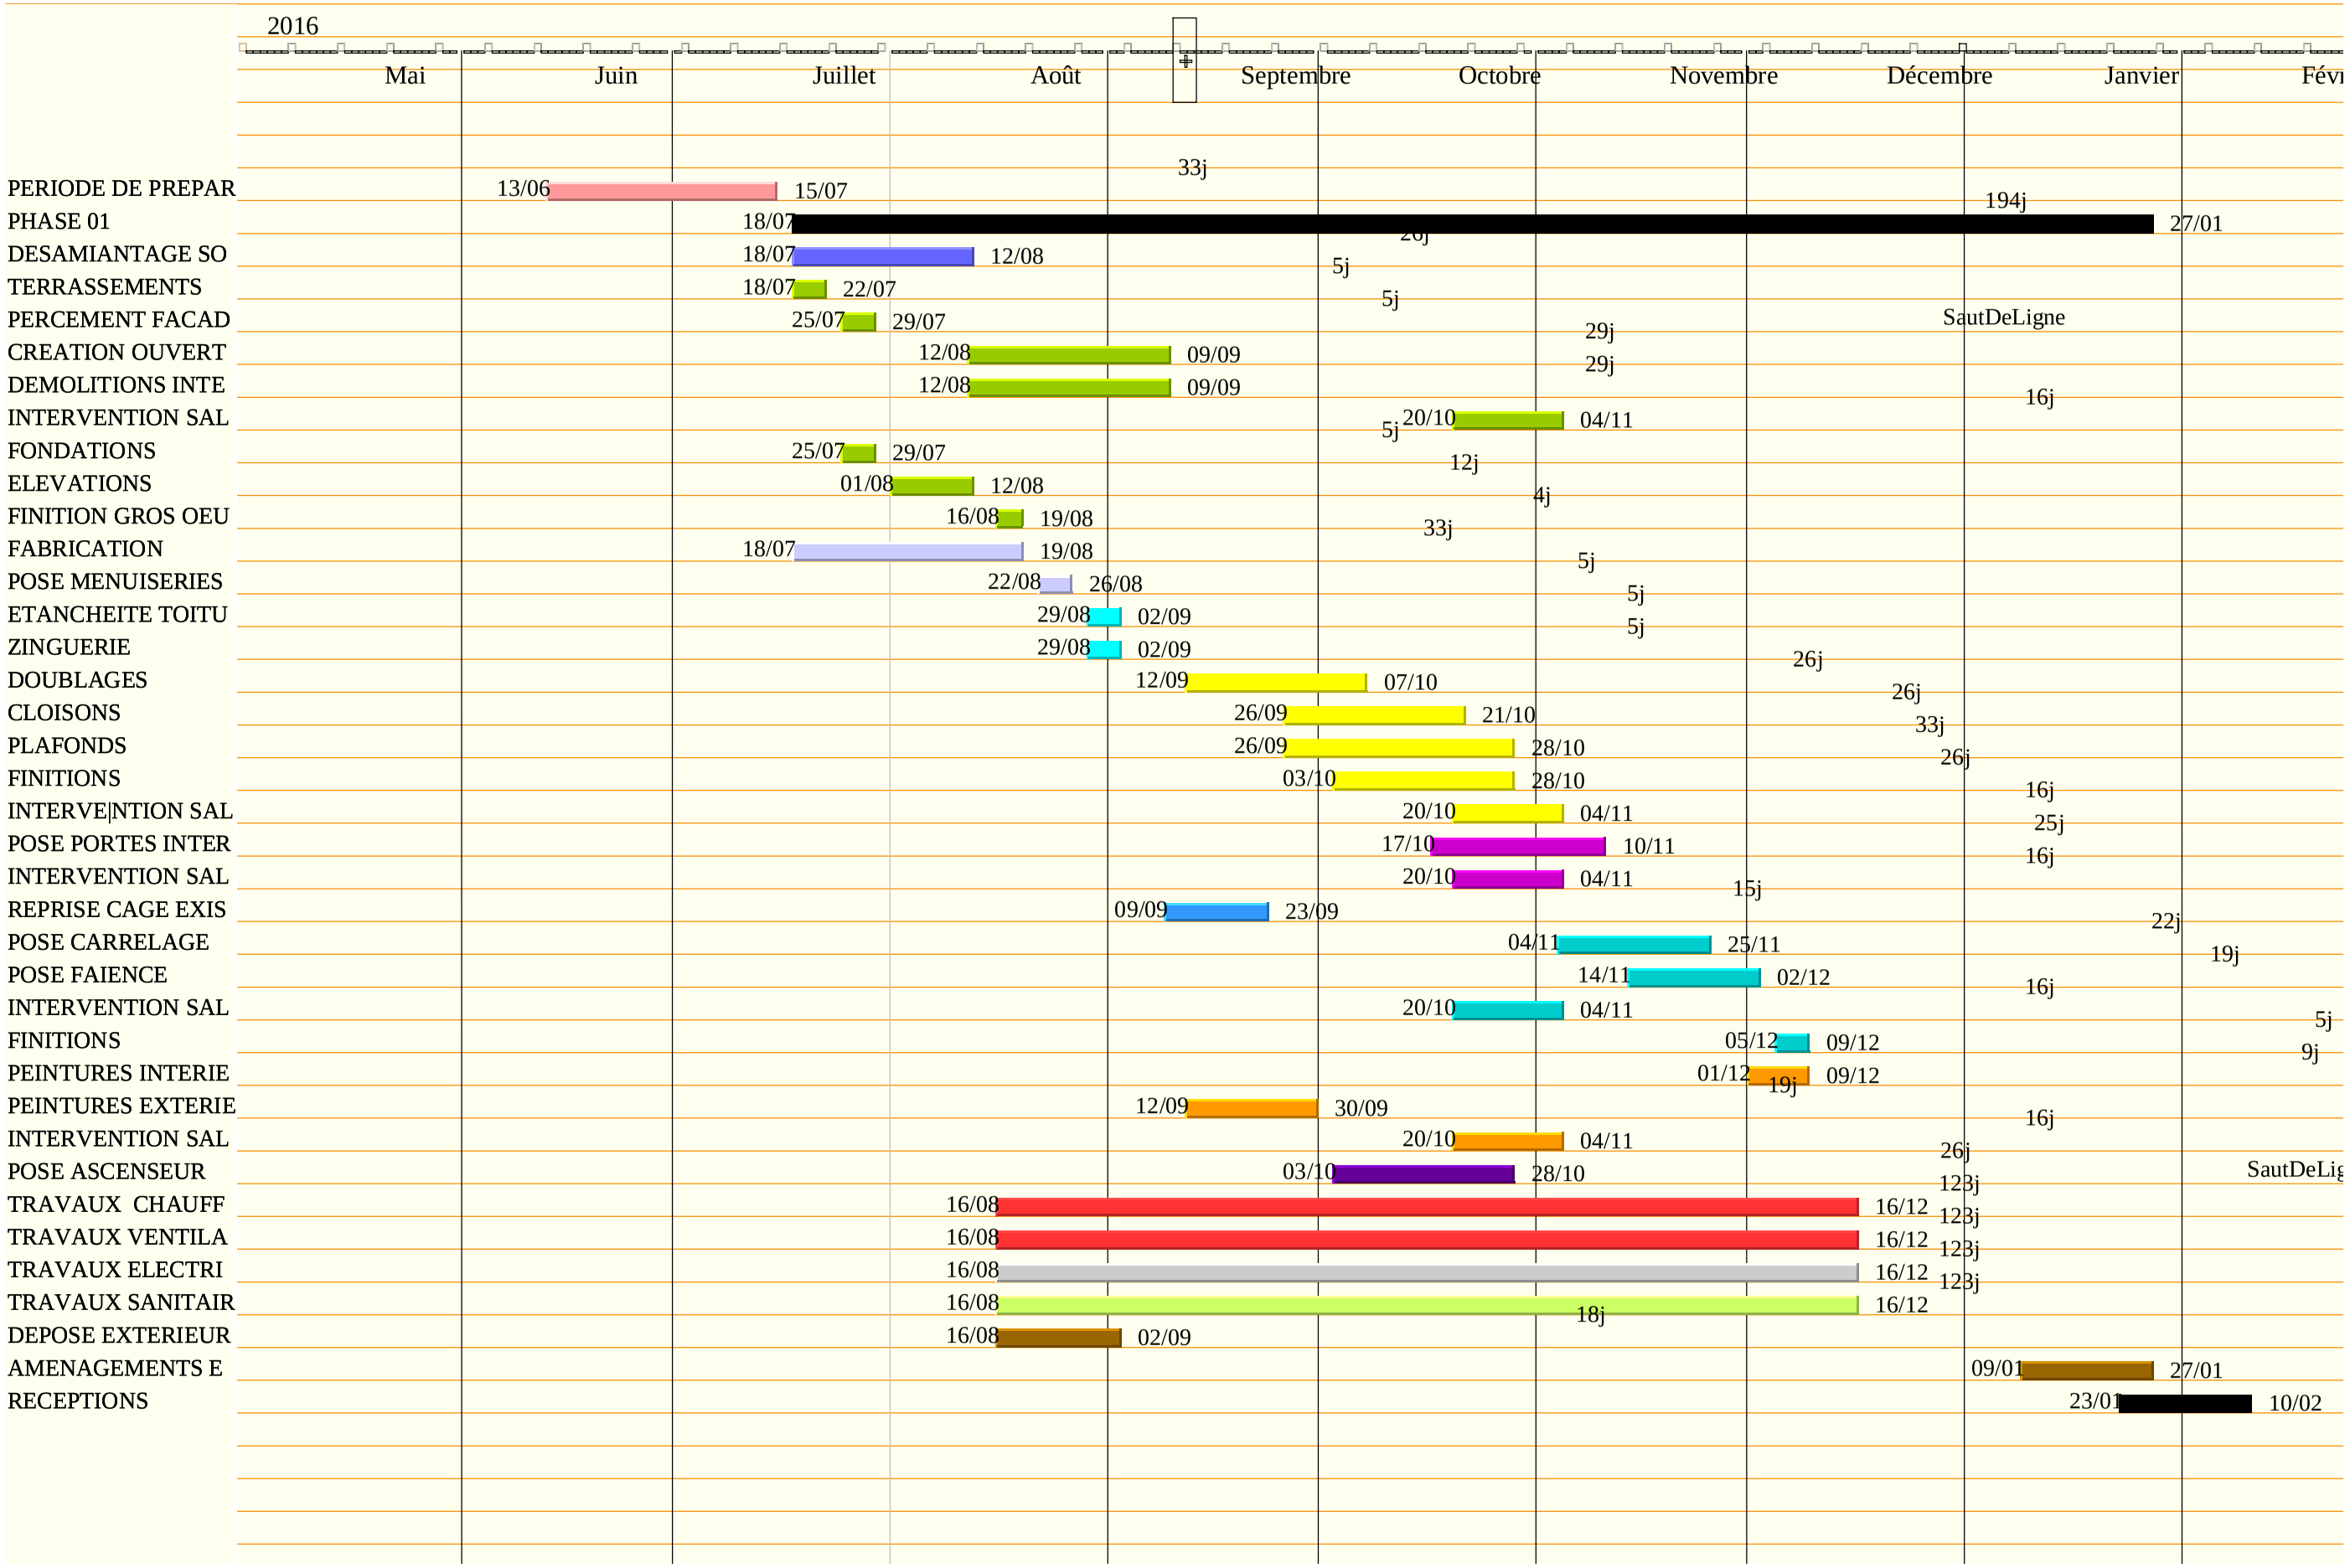
2016
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Févr
PERIODE DE PREPAR 13/06 15/07 33j
PHASE 01 18/07 27/01 194j
DESAMIANTAGE SO 18/07 12/08 26j
TERRASSEMENTS 18/07 22/07 5j
PERCEMENT FACAD 25/07 29/07 5j
CREATION OUVERT 12/08 09/09 29j
DEMOLITIONS INTE 12/08 09/09 29j
INTERVENTION SAL 20/10 04/11 5j
FONDATIONS 25/07 29/07 SautDeLigne
ELEVATIONS 01/08 12/08 12j
FINITION GROS OEU 16/08 19/08 4j
FABRICATION 18/07 19/08 33j
POSE MENUISERIES 22/08 26/08 5j
ETANCHEITE TOITU 29/08 02/09 5j
ZINGUERIE 29/08 02/09 5j
DOUBLAGES 12/09 07/10 26j
CLOISONS 26/09 21/10 26j
PLAFONDS 26/09 28/10 33j
FINITIONS 03/10 28/10 26j
INTERVE|NTION SAL 20/10 04/11 16j
POSE PORTES INTER 17/10 10/11 25j
INTERVENTION SAL 20/10 04/11 16j
REPRISE CAGE EXIS 09/09 23/09 15j
POSE CARRELAGE 04/11 25/11 22j
POSE FAIENCE 14/11 02/12 19j
INTERVENTION SAL 20/10 04/11 16j
FINITIONS 05/12 09/12 5j
PEINTURES INTERIE 01/12 09/12 19j 9j
PEINTURES EXTERIE 12/09 30/09 16j
INTERVENTION SAL 20/10 04/11 26j
POSE ASCENSEUR 03/10 28/10 SautDeLig
TRAVAUX CHAUFF 16/08 16/12 123j
TRAVAUX VENTILA 16/08 16/12 123j
TRAVAUX ELECTRI 16/08 16/12 123j
TRAVAUX SANITAIR 16/08 16/12 123j
DEPOSE EXTERIEUR 16/08 02/09 18j
AMENAGEMENTS E 09/01 27/01
RECEPTIONS 23/01 10/02
